进度计划（全量 40 项 · 共 266 天）

排期方式

正排（从开工日往后推）

开工日期


2026/10/05

目标竣工日期

2027/10/05

甘特图


2026年10月
2026年11月
2026年12月
2027年1月
2027年2月
2027年3月
2027年4月
2027年5月
2027年6月
1. 线下沟通
2. 评审公司评审
3. 市发改委上主任会
4. 分管副市长签批
5. 区发改委批复
6. 市发改委批复
7. 初步设计概算审批
8. 取得一级开发单位划拨土地
9. 钉桩（规划用地测量条件 → 钉桩测量成...
10. 用地预审与选址意见书
11. 土地权属审查（地籍图 / 界址点坐标）
12. 土地线下传递信息表 + 土地请款 + 支出...
13. 出入库手续（网上操作）
14. 国有土地划拨手续
15. 多规合一初审意见
16. 综合会商意见
17. 建设工程规划许可证（规证）
18. 勘察图纸备案
19. 消防审图（消防设计审查）
20. 施工图备案
21. 交通影响评价（交评）
22. 水影响评价（水评）
23. 社会稳定风险评估（稳评）
24. 环境影响评价（环评）
25. 装配式评审
26. 节能评估
27. 地震安全性评价
28. 地质灾害评估
29. 提前开展勘察设计招标方案审查
30. 设计招标
31. 勘察招标

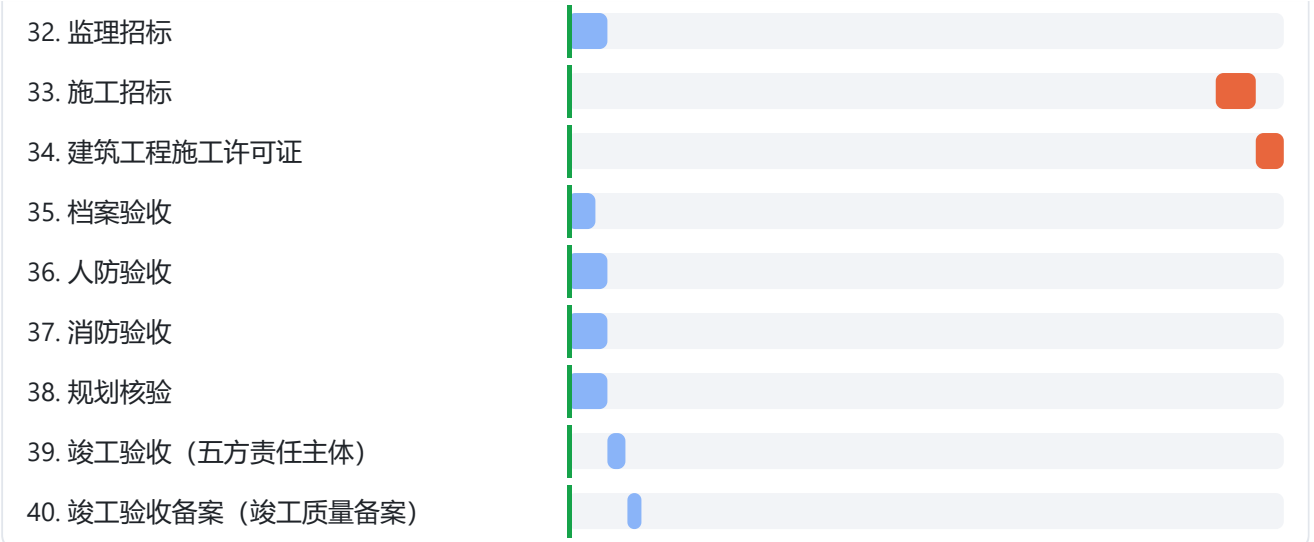

关键路径（11 项）

编号	名称	最早开始	最早完成
8	取得一级开发单位划拨土地	2026-10-05	2026-10-11
9	钉桩（规划用地测量条件 → 钉桩测量成果报告）	2026-10-12	2026-11-10
10	用地预审与选址意见书	2026-11-11	2026-11-30
15	多规合一初审意见	2026-12-01	2027-02-04
16	综合会商意见	2027-02-05	2027-03-20
17	建设工程规划许可证（规证）	2027-03-21	2027-04-09
18	勘察图纸备案	2027-04-10	2027-04-19
19	消防审图（消防设计审查）	2027-04-20	2027-05-11
20	施工图备案	2027-05-12	2027-06-02
33	施工招标	2027-06-03	2027-06-17
34	建筑工程施工许可证	2027-06-18	2027-06-27

关键节点

节点	计划日期
线下沟通	2026-10-05 ~ 2026-10-19

节点	计划日期
交通影响评价（交评）	2026-10-05 ~ 2026-10-19
多规合一初审意见	2026-12-01 ~ 2027-02-04
提前开展勘察设计招标方案审查	2027-02-05 ~ 2027-02-19
建筑工程施工许可证	2027-06-18 ~ 2027-06-27
竣工验收备案（竣工质量备案）	2026-10-27 ~ 2026-10-31
